

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
u z a v ř e n é d n e 2 5 . 1 0 . 2 0 1 7
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejímž jménem jedná:

Sídlo:

IČO, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

Ing. Martin Lehký, ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

60460580, CZ60460580

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – ředitel, tel.: +420 973 204 090

Ing. Monika Rešl Kletečková – vedoucí odd.inv. akcí

tel.: +420 973 203 992, mobil: 702 209 151

e-mail: monika.resl@as-po.cz

Ing. Petr Kolář – ekolog

tel.: + 420 973 321 121, mobil: 602 242 487

e-mail: petr.kolar@as-po.cz

Miroslav Tábořský

tel.: +420 973 245 835, +420 602 550 512

e-mail: miroslav.taborsky@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupuje:

Sídlo:

IČO, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

ROZEPOS s.r.o.

Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 24724

Mgr. Lukáš Trachta, DiS. - jednatel

Moskevská 2715, 390 05 Tábor

04908503, CZ04908503

Raiffeisen bank

9275194001/5500

64mq732

Mgr. Lukáš Trachta, DiS., tel.: +420 605 840 286

Zdeněk Trachta, tel.: +420 720 987 006

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 11.4. na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Odstranění stavby plynové kotelny, komínu, nadzemních parních rozvodů ve vojenském areálu Bechyně“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 25. 10. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ:

Termín zahájení: od uveřejnění smlouvy dle bodu 11.2. této smlouvy.

Termín ukončení plnění: do 4. 12. 2017

Místo plnění: Vojenský areál Bechyně, GPS: 49.2893736N. 14.5083989E.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 4: Oznámení změny č. 1, změnový list č. 1 včetně příloh (5 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a jedno pare objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 23.11.2017

V Táboře dne: 23.11.2017

v zastoupení
Ing. Pavel KOLOUCH

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Ing. Martin Lehký

ředitel
ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Moskevská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460586



ROZEPOS s.r.o.

Mgr. Lukáš Trachta, DiS.

jednatel

ROZEPOS s.r.o.
Moskevská 2715, 390 05 Tábor
IČ: 049 08 503 DIČ: CZ049 08 503
Tel.: 605 840 286 email: info@rozeapos.cz

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	ROZEPOS s.r.o. Moskevská 2715, 390 05 Tábor			
Investor:	Armádní Servisní, p.o. Podbabská 1589/1, Praha 6	Datum: 20.11.2017		
Název akce: Odstranění stavby plynové kotelny, komína, nadzemních parních rozvodů ve vojenském areálu Bechyně				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒ 20.11.2017	faxem ☐	osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:	fotodokumentace		
	na výkresy:	situace		
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<u>Předmět změny:</u> Změna termínu dokončení z důvodu většího objemu podzemních částí betonových patek pod parovody a pracnosti při jejich odstraňování; dokončení do 4.12.2017. <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Projektová dokumentace předpokládala rovnoměrné patky (podle vystupujících částí nad terénem); ve skutečnosti jsou některé patky zahraněny pouze nad terén a v zemi se nacházejí betonové nálitky násobně překračující předpokládané rozměry patek.				
Počet připojených listů specifikací:		5		
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává: zhotovitel				

Mgr. Lukáš Trachta, DiS.


ROZEPOS s.r.o.

Moskevská 2715, 390 05 Tábor
IČ: 049 08 503 DIČ: CZ049 08 503
Tel.: 605 840 286 email: info@rozeapos.cz

Stanovisko technického dozoru stavby:

Dle zjištění TDS objem betonu podzemních částí patek značně překračuje objem předpokládaný v PD. TDS souhlasí s posunutím termínu.


ARCHIPRO s.r.o.
architektura a projekty staveb
Chýnovské 1917/9, 390 02 Tábor
Tel.: 389 822 413, 603 517 692
IČ: 28139399 DIČ CZ28139399


Ing. Miloslav Bílek**Stanovisko projektanta stavby:**

Projektová dokumentace bouracích prací byla vyhotovena na základě dokumentace stávajících venkovních rozvodů a přidružených provozů, kterou projektant obdržel jako podklad pro projektování od majitele a provozovatele objektů. Dokumentace, byla neúplná zvláště ve stavební profesi a ne zcela odpovídala skutečnému stavu výstavby. Dokumentace předpokládala rovnoměrné patky. Projektant nemohl předpokládat, že v zemi pod terénem budou na patkách betonové nálitky, které násobně překračují předpokládaný rozměry patek nadzemních areálových rozvodů.


Tomáš Svoboda**Stanovisko investora stavby:**

Investor akceptuje oprávněnost posunutí termínu z důvodu většího objemu podzemních objektů – patek.


Ing. Monika Rešl Kletečková

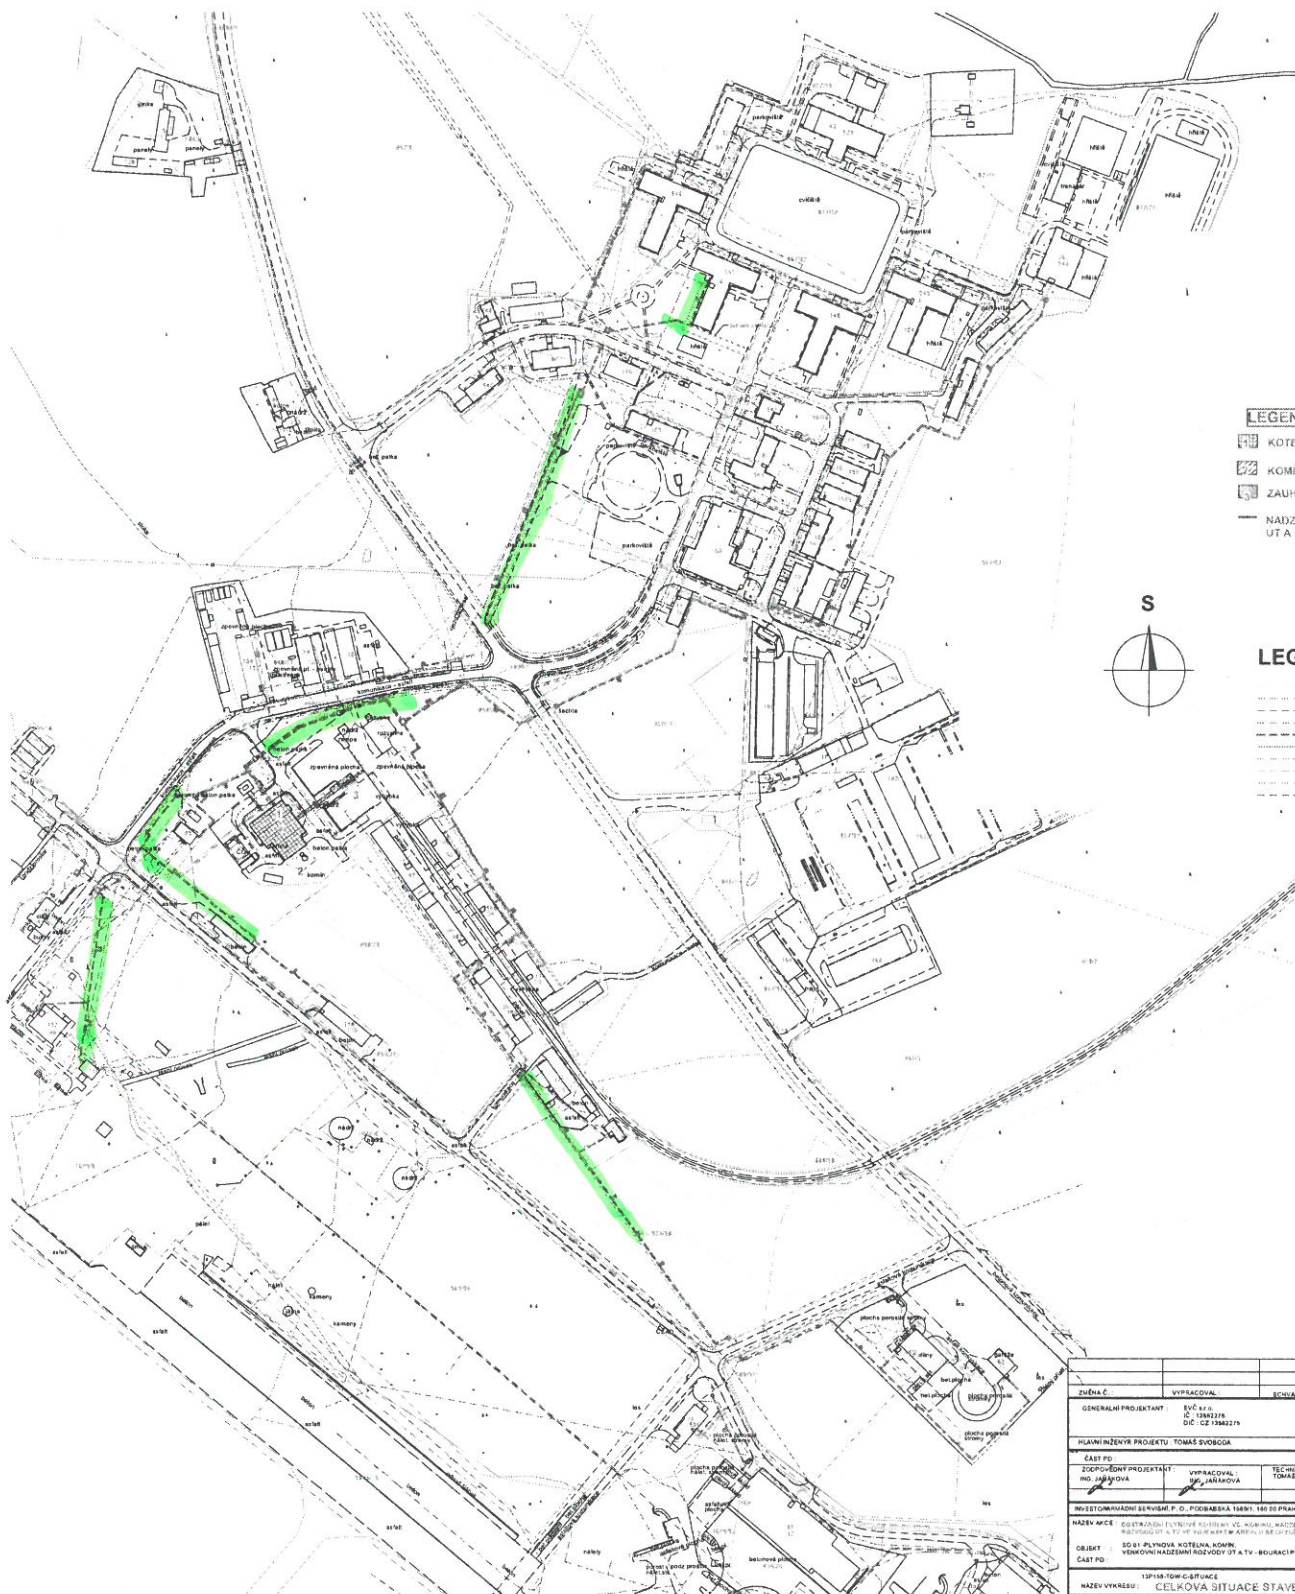
Příloha : Fotodokumentace vybouraných patek 5 listů + 1 situace











LEGENDA


- KOTELNA
- KOMIN
- ZAHRADOVÁNÍ
- NADZEMNÍ ROZVODY
- ULICE



LEGENDA

- PLYNOVÁ
- VODY
- KANALIZAČNÍ
- DEŠŤOVÁ
- TECHNICKÁ
- ZELÉNOVÉ PLOCHY
- OSTATNÍ ZELÉNOVÉ PLOCHY

ZVĚŘENÍ	VYPRACOVAL	SCHEMATA	DATUM	POPS
GENÉRALNÍ PROJEKTANT	ING. J. S. J. Č. 13862178 DČ. 13862178			
Hlavní inženýr projektu: TOMÁŠ ŠVOBODA				
ČÁST PD				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	JANÁK - PROJEKTOVÁNÍ	
ING. J. S. J. Č. 13862178	ING. J. S. J. Č. 13862178	TOMÁŠ ŠVOBODA	SLEZSKÁ UL. PRAHA 3 V BOKRATY	
INVESTOR: MĚSTSKÝ ÚŘAD PRAHA 6, PŘÍKAZNÍK: 180 00 PRAHA 6			PRAHA 6 - MĚSTSKÁ TŘEBOVA	
NAZEV AKCE: OBSTAVĚNÍ PLYNOVÉ KOTELNY VE SPOLEČNOSTI S VODNÍM A KANALIZAČNÍM SÍŤOVÝM			ČÍSLO ZÁKAZY	
OBJEKT: SO 81 - PLYNOVÁ KOTELNA, KOMIN, VÝKONOVÝ NADZEMNÍ ROZVOD UT A TV - BOKRATY			131018	
ČÁST PD			FORMÁT AK	
13118-TOW-C-SITUACE			R	
NAZEV VÝKRESU: CELKOVÁ SITUACE STAVBY			STUPĚN PD	
			001	
			DATUM	
			2021/4	
			ČÍSLO VÝKRESU	
			PANEČ	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	ROZEPOS s.r.o. Moskevská 2715, 390 05 Tábor	
Změnový list vystavil:	Ing. Monika Rešl Kletečková	
Datum:	22.11.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna termínu dokončení z důvodu většího objemu podzemních částí betonových patek pod parovody a pracnosti při jejich odstraňování; dokončení do 4.12.2017. Popis a zdůvodnění změny: Projektová dokumentace předpokládala rovnoměrné patky (podle vystupujících částí nad terénem); ve skutečnosti jsou některé patky zahraněny pouze nad terén a v zemi se nacházejí betonové nálitky násobně překračující předpokládané rozměry patek.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	nejpozději do 4.12.2017	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	ROZEPOS s.r.o. Moskevská 2715, 390 05 Tábor IČ: 049 08 503 DIČ: CZ049 08 503 Tel.: 605 840 286 email: info@rozepos.cz	
Datum: 23.11.2017	Datum: 23.11.2017	

TDS SOUHLASÍ

23.11.2017

ARCHIPRO s.r.o.
 architektura a projekty staveb
 Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor
 Tel.: 389 822 413, 603 517 692
 IČ: 28139399 DIČ: CZ28139399
